



Avstängningar vattenanläggning Hamnängen

1	Lingonbergsområdet	59 36 643	18 50 704
2	Direkt från pumphuset Nedanför jonas räf	59 36 627	18 50 646
3	Ventil till lingonberget	59 36 613	18 50 461
4	Ventil ängsbacken	59 36 613	18 50 455
5	Ventil vändplan eriksson Skarv till pumphus	59 36 707	18 50 558
6	Rörskarv ovanför pumphus	59 36 754	18 50 467
7	Påstick Niskanen	59 36 620	18 50 446
8	Avstängning Niskanen + 2	59 36 639	18 50 489

Nils Ekstedt

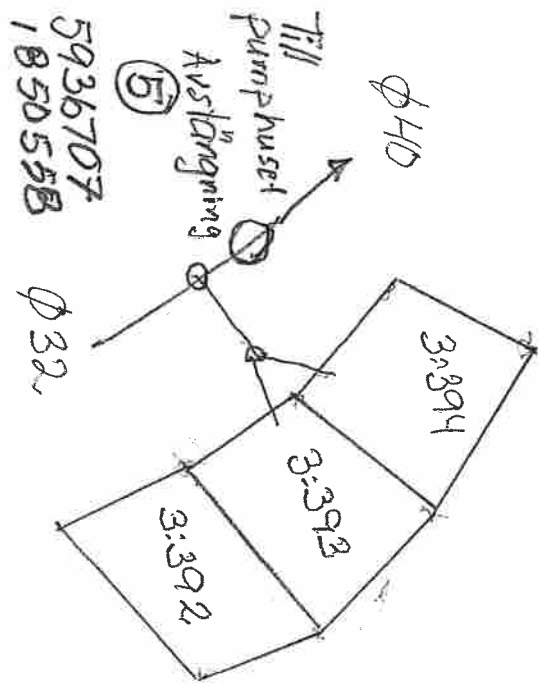

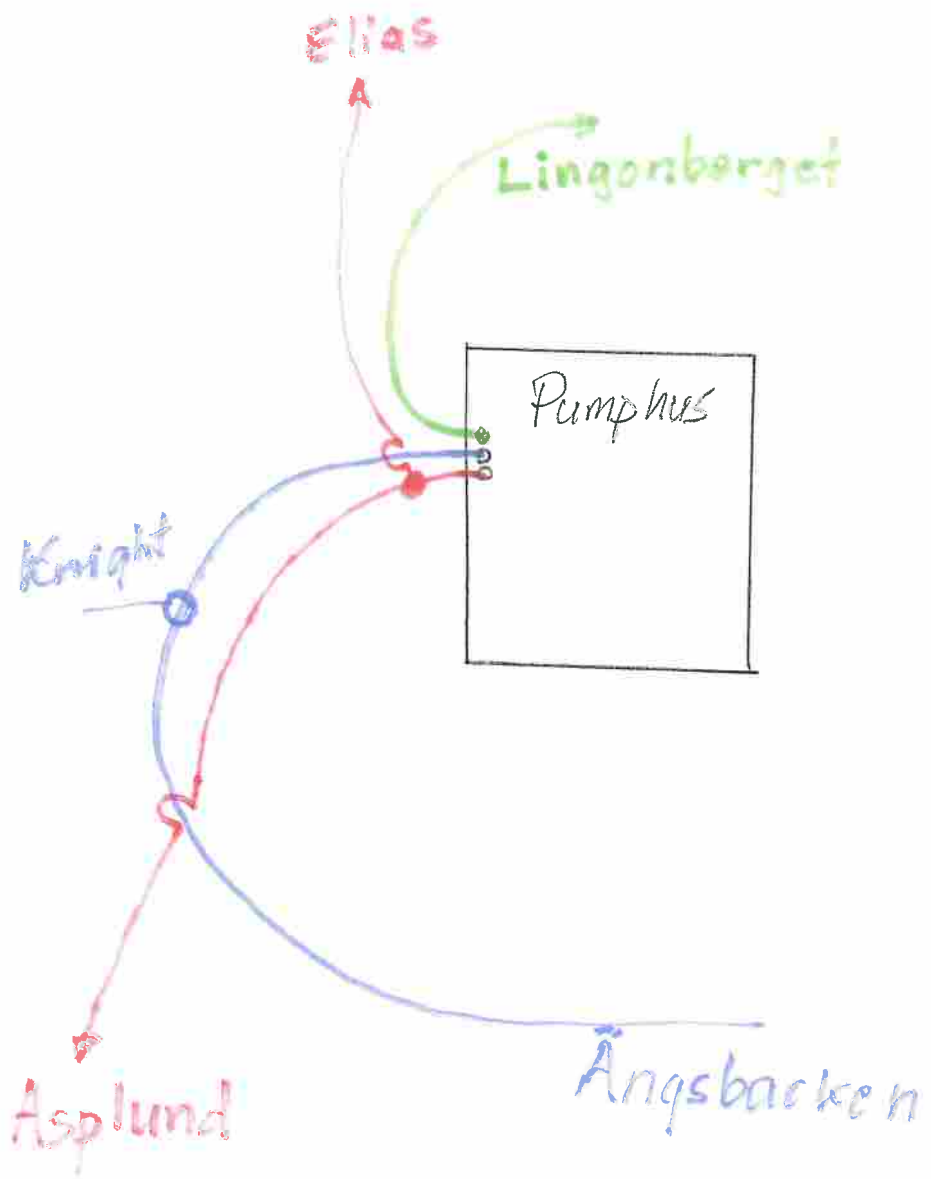



VATTENANLAGGNINGS-

FIRMA VATTEN

AKTIEBOLAG

KVARNGATAN 3B. STOCKHOLM SÖ. TELEFON 44 19 10

Brunnsbörningar
Pumpanläggningar
Konsulterande
ingenjörer och geologer
Mekanisk verkstad

Provpumpningsprotokoll

Ippdragsgivare Major Sven Nordenskjöld

Lidingö

Borrplats Hammängen, Yxlan

Uppgivet vattenbehov timliter

Prov-pumpning i borrhålets botten lämnade 4.500 timliter

Avstånd mellan markytan och vattenytan i borrhålet när pumpning ej utföres 0,1 m

Avst. ' mellan markytan och borrhålets utgångspunkt: m

Borrat djup: Rödrörning 6 m + Bergbörning 64 m 70 "

Totalt djup från markytan räknat: S:a 70 "

Borrhål nr M.12/JN/LS/BJ

Borrhålets diameter 110 mm

Borrhålet beklätt till djupet 6 m

med rör 110 122 mm

och cementinjekterat från djupet 0

m till djupet 10 m.

Prov-pumpning den	Borrhålets djup	Djup till bottensilen, räknat från markytan	Prov-pumpning antal timmar *	Erhållen vattenmängd timliter	Avstånd mellan markytan och vattenytan i borrhålet under provpumpningen	Anmärkningar
31/5	70	66	16	5.400		
2/6	"	"	24	4.500		
3/6	2	"	22	4.500		
5/6	"	"	8	4.500		
			70			

Vaxholm den 10/6 19 67

Jonas Nordin
Arbetsledare

* Provpumpningstid räknas även tid, som ätgär för nedsättning och upptagning av provpumpningsmaterielen.

s.1 Provpumpningsprotokoll skall inlämnas i 1 exemplar för varje borrhål.

Tillhör kommunalfullmäktiges
beslut av den 24/6 Betygar:
